

# Démantèlement colonne D202



## Désignation des Prestations

Démantèlement d'une colonne de 35M de longueur et pesant 75T

Démantèlement des tuyauteries et accessoires de la colonne

Le lavage et la décontamination des éléments à évacuer souillés par l'arsenic

La récupération et le retraitement des effluents

Les Travaux d'échafaudages

Les travaux de levage

Les transports

**ETME**  
Extraction - Transport - Montage - Echangeur





# ETME


Extraction - Transport - Montage - Echangeur



# E.T.M.E

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

## Etude Démantèlement de la colonne D202

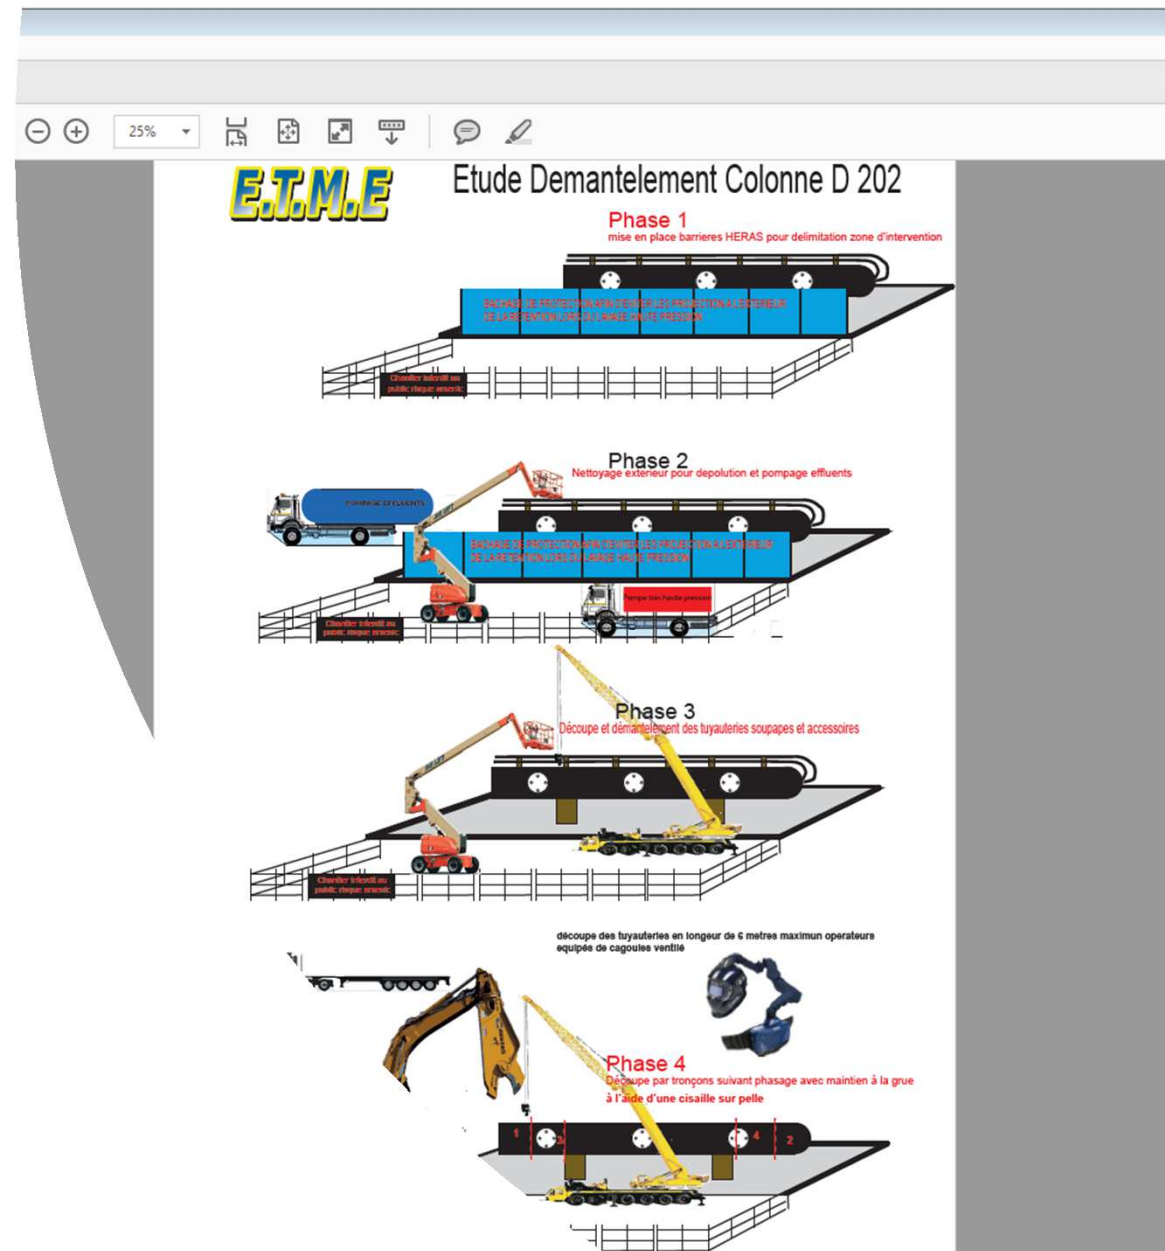






## PLANNING INTERVENTION



	Semaine 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5
Réunion de travail pour validation planning et synchronisation des opérations  Plan de prévention	- balisage de la zone par la mise en place des barrières Heras mise en place bache - Nettoyage HP de la colonne et des tuyauteries restantes du projet - Pompage et élimination des effluents	Découpe et démantèlement des tuyauteries et accessoires sur colonne D202	Démantèlement de la colonne par tronçons de 6 mètres + évacuation des éléments	Démantèlement de la colonne par tronçons de 6 mètres + évacuation des éléments	- Démantèlement des tuyauteries restantes du projet - Evacuation des déchets liés à l'intervention - Nettoyage de l'aire de lavage - Replis du chantier
<b>Matériel nécessaire</b>					
	- Pompe HP  - Tonne pour Pompage  - Nacelle Télésopique  - Chariot Télésopique	- Grue Automotrice  - Nacelle télésopique  - camion plateau  - Chariot Télésopique	- Grue Automotrice  - nacelle télésopique + chariot Télésopique  - cisaille Hydraulique  - Camion plateau	- Grue Automotrice  - nacelle télésopique + chariot Télésopique  - cisaille Hydraulique  - Camion plateau	- Pompe HP  - Tonne pour Pompage  - Chariot Télésopique  - Camion plateau
<b>Ressources personnel</b>					
	1 chef de projet ,1 Chef de chantier + Monteurs	1 chef de projet ,1 Chef de chantier + Monteurs	1 chef de projet ,1 Chef de chantier + Monteurs	1 chef de projet ,1 Chef de chantier + Monteurs	1 chef de projet ,1 Chef de chantier + Monteurs



# Organigramme Intervention

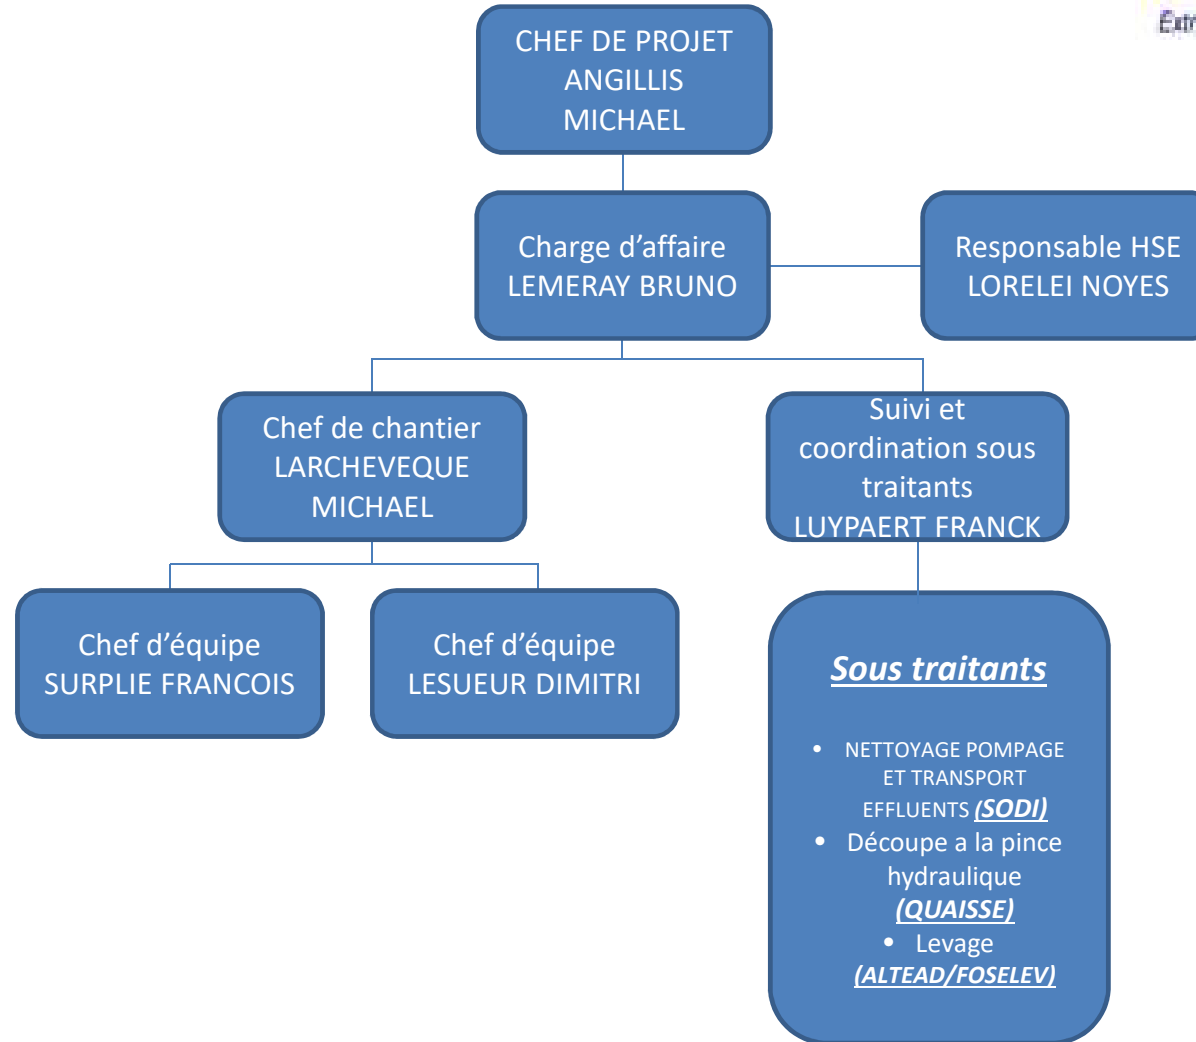

# **ETMLE**

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

---

Balisage de la zone  
chantier Barriere  
Heras + film polyane







# PINCE HYDRAULIQUE





**ETMLE**

Extraction - Transport - Montage - Echangeur



# **ETMLE**

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

---

Manutention et  
levage a l'aide d'une  
grue automotrice de  
50T





# **ETME**

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

---

Chargement des éléments  
sur camion surbaissé  
transport en convoi  
exceptionnel CAT 1



# **ETMLE**

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

---

Découpe des parties  
INOX au plasma avec  
équipement ARI





# ETMLE

Extraction - Transport - Montage - Echangeur

Ramassage des anneaux  
avec protections  
spécifiques





Nettoyage de la zone a la HP après évacuation des derniers éléments

---



# Rendu de la Zone Néttoyée et dépollué au client

---

